

Kloakering og dræning af Vejlbysommerhusområde




- Status på etape 1 og 2
- Tidsplan etape 3 og 4
- Planlagte aktiviteter
- Tilbageblik på forløbet af anlægsprojektet
- Erfaringsopsamling

Status på etape 1 og 2

Følgende er etableret:

- 4617 m kloakledning og 333 m trykledning
- 4600 m drænledning og 898 m trykledning
- 4 spildevandspumpestationer
- 2 drænpumpestationer
- 250 sommerhuse er kloakeret
- Ca. 120 sommerhuse er tilsluttet

Tidsplan etape 3

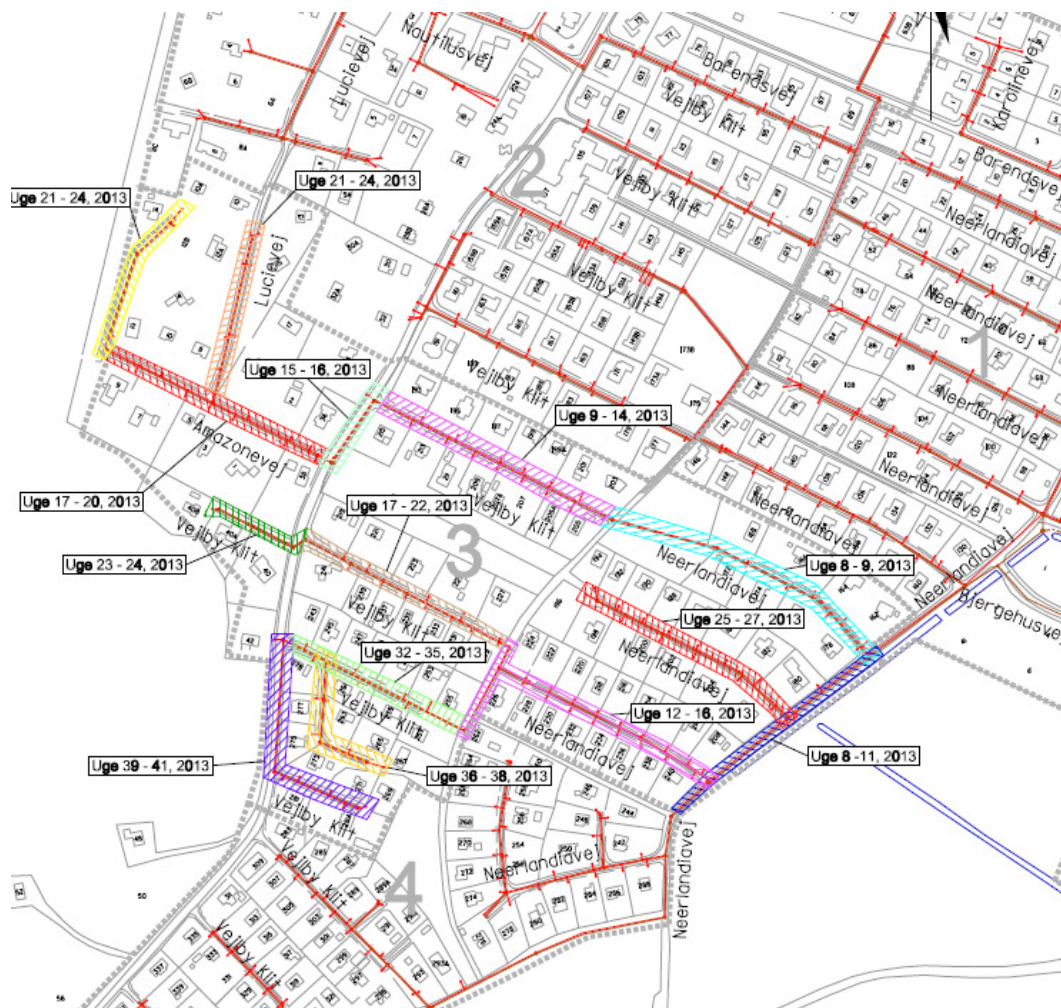

3

Etapenummer

Projekteret spildevandskloak

Projekteret trykledning - spildevand

Projekteret drænledning

Projekteret trykledning - drænvand

Forventet tidsplan for gravearbejde:

Voraussichtliche Zeitplan für das Graben:

	Kloak i Neerlandavej nr. 162 - 178
	Kloak i Neerlandavej - stamvej ud for nr. 162, 178, 180, 206, 208 og 240
	Kloak i Neerlandavej nr. 180 - 206
	Kloak i Neerlandavej nr. 208 - 240
	Kloak i Vøjby Klit nr. 281 - 281A og stamvej ud for Vøjby Klit nr. 42 - 281
	Kloak i Vøjby Klit nr. 261 - 279
	Kloak i Vøjby Klit nr. 243 - 279
	Kloak i Vøjby Klit nr. 219 - 241
	Kloak i Vøjby Klit nr. 40 - 40B
	Kloak i Amazonevej nr. 1 - 9 og 2 - 12 og Vøjby Klit nr. 36 - 38
	Kloak i Amazonevej nr. 12 - 14
	Kloak i Vøjby Klit - stamvej ud for nr. 34 - 38
	Kloak i Lucievej nr. 10 - 17 og ud for Amazonevej nr. 4 og 8
	Kloak i Vøjby Klit nr. 193 - 215
	Kloakering udført og afsluttet


Kontaktpersoner:

Bygherre: LEMVIG VAND & SPILDEVAND A/S: Jesper Primdahl tlf. 96 90 80 03


Entreprenør: Ib G. Jensen A/S: Torben Jensen tlf. 22 20 62 66

Rådgiver: Orbicon A/S: Mikael Huber tlf. 20 99 01 07

Tidsplan etape 4 nord

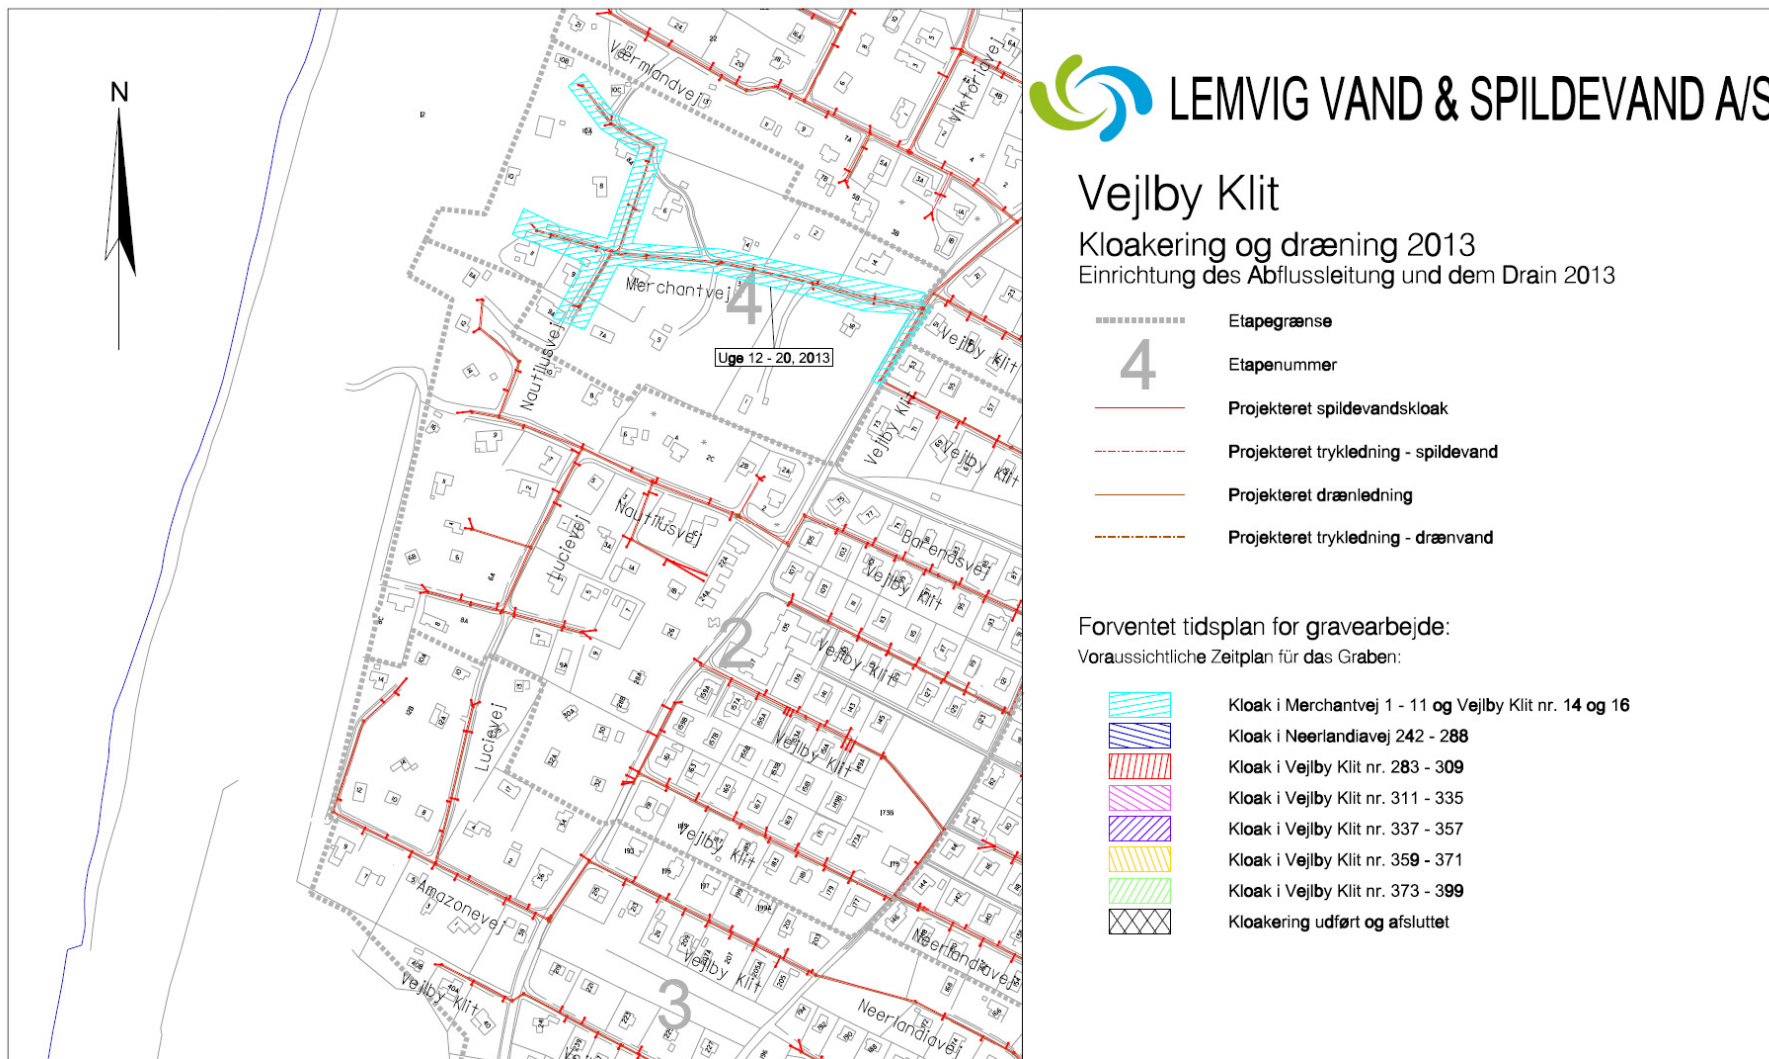


Tidsplan etape 4 syd

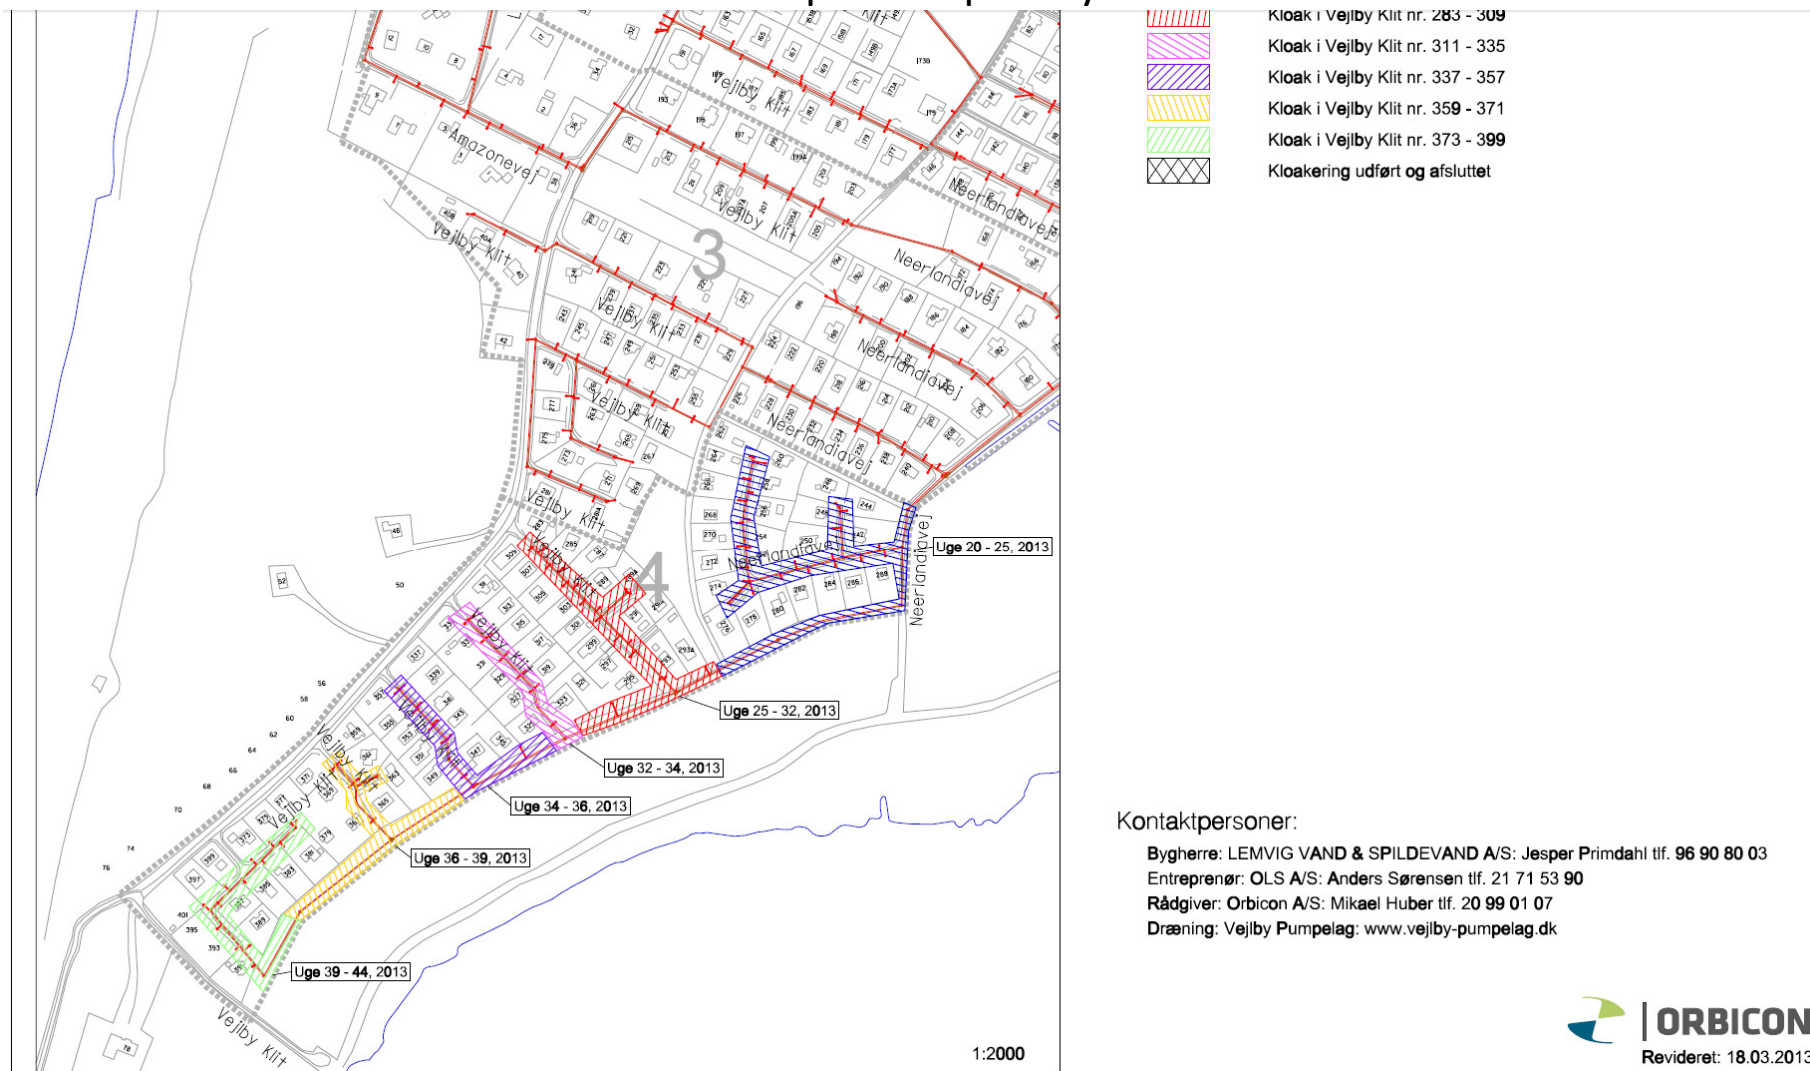

Hvad skal i som grundejere huske ?


- Tilslutningspligt pr. den 1. december 2013
- Kloakmester erklæring skal sendes til Lemvig kommune
- Tilfredshedserklæring skal retur til entreprenøren inden for den givne frist, hvis i har bemærkninger til arbejdet

Spildevand skal kobles på den offentlige kloak

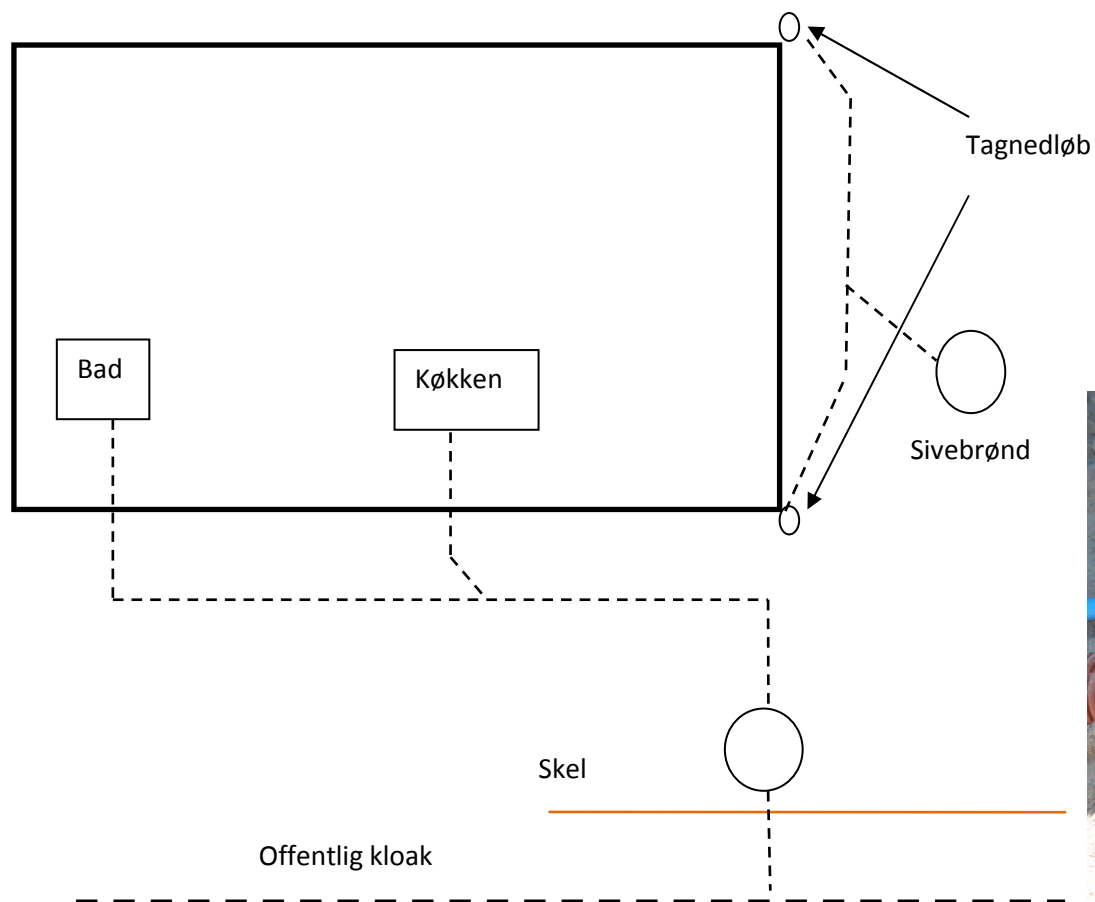

Hvordan ser en kloakmester erklæring ud ?

Lemvig Kommune Teknik & Miljø Rådhusgade 2, 7620 Lemvig E-mail: teknisk@lemvig.dk		Ekspeditionstid: Mandag - onsdag kl. 09.30 - 15.00 Torsdag kl. 09.30 - 17.00 Fredag kl. 09.30 - 13.00																			
Sendes til Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig		Udfyldes af kommunen Byggesagsnummer Byggestilladelsesdato Modtaget dato Erklæring/færdigmelding fra autoriseret mester																			
Jeg erklærer, at følgende arbejde på ejendommen Adresse Fuglebækken 7, 7650 Bøvlingbjerg Matrikelbeholdning Ejendomsnr. Villy Grønsgaard																					
er udført efter gældende bestemmelser																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Kloakarbejder</td> <td>☐ Indvendig</td> <td>☒ Udvendig</td> <td>☐ Nyt fælles-system</td> <td>☐ Ændret eksisterende fællessystem</td> </tr> <tr> <td>☒ Nyt separat-system</td> <td>☐ Ændret eksisterende separat-system</td> <td>☐ Ny septiktank</td> <td>☐ Ændret eksisterende septiktank</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Sanitetsarbejder</td> <td>☐ Vand- og sanitetsarbejder</td> <td>☐ Gasinstallationer</td> <td>☐ Andet</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				Kloakarbejder	☐ Indvendig	☒ Udvendig	☐ Nyt fælles-system	☐ Ændret eksisterende fællessystem	☒ Nyt separat-system	☐ Ændret eksisterende separat-system	☐ Ny septiktank	☐ Ændret eksisterende septiktank	Sanitetsarbejder	☐ Vand- og sanitetsarbejder	☐ Gasinstallationer	☐ Andet					
Kloakarbejder	☐ Indvendig	☒ Udvendig	☐ Nyt fælles-system		☐ Ændret eksisterende fællessystem																
	☒ Nyt separat-system	☐ Ændret eksisterende separat-system	☐ Ny septiktank	☐ Ændret eksisterende septiktank																	
Sanitetsarbejder	☐ Vand- og sanitetsarbejder	☐ Gasinstallationer	☐ Andet																		
Ændringer/bemærkninger til det godkendte arbejde Se tidligere fremsendt tegning.																					
Arbejdet blev påbegyndt den																					
Anmeldelse blev foretaget																					
Stempel		Dato Aut. mesteres underskrift																			
Arbejdet blev færdigt den																					
Ændringer/bemærkninger til tidligere oplysninger om arbejde - revideret projekt og tegninger vedlægges.																					
Arbejdet færdigmeldes																					
Stempel OLS A/S ENTREPRENØR Hvedemarken 27 · 7620 Lemvig Telefon 9782 2588 · BILH. 4099 1566 Telefax 9781 1588		Dato 05.09.2011 Aut. mesteres underskrift <i>Jesper Jensen</i>																			

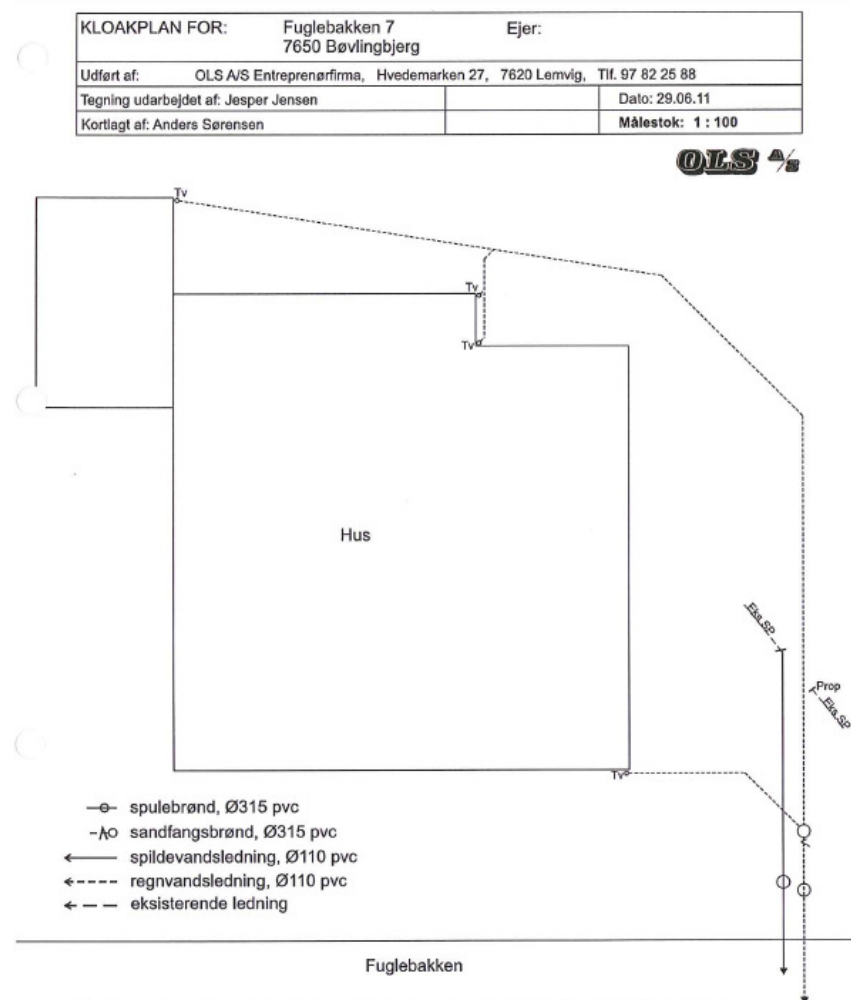

Eksisterende spildevandsledning er tilsluttet ny spildevandsskelbrønd. Og eksisterende afløb proppet.
 Ny regnvandsledning er etableret fra 4 stk tagedløb og ført til sandfangsbrønd, som vist.
 Afløb fra sandfangsbrønd er tilsluttet ny regnvandsskelbrønd, som vist.

Planlagte aktiviteter

- Reetablering af grunde 29 april – 8 maj 2013
- Støbning af betonkasser omkring dæksler
- Neerlandiavej asfalteres 7-8 maj 2013
- Stier og veje i etape 1 og 2 finreetableres 8-17 maj 2013
- Aflevering uge 21



Tilbageblik opstart etape 1 uge 26 2012



Tilbageblik
1. kloakledning etableret



Et vådt efterår forsinker anlægsarbejdet

334 mm nedbør i perioden 1 sep. 2012 til 31. november 2012

74 dage med nedbør (91)

75 % mere nedbør i september end normalt



Kilde DMI Thyborøn målestation

Arbejdet forsætter



Der rodes





LEMVIG VAND & SPILDEVAND

Grundvandssænkning ikke et problem

MEN !

Sætning af pumpestationen ved Neerlandiavej gav en del problemer, bl.a. pga. et 3 meter gruslag

Der blev pumpet 500.000 liter vand væk i timen !

Arbejdet forsætter



Arbejdet er næsten færdigt



Erfaringsopsamling

Hvad gik godt ?

Hvad gik ikke så godt ?

Spørgsmål
